

2回目事後モニタリング結果報告書

放射線測定記録<地表>

資料4-3①

行政区名	高瀬	管理番号	011001110
地権者名	浪江町 様		
所在地	大字高瀬字丈六10 外		
測定日 (天候)	緊急 除染前	平成24年6月20日, 平成24年6月21日(晴)	
	緊急 除染後	平成24年11月21日, 平成24年11月22日(晴)	
	前回 FU除染後	平成28年11月2日(晴)、平成28年11月14日(晴)	
	今回	平成29年9月29日(晴)、平成29年10月6日(晴)	

今回測定の高さの放射線量(μSv/h)測定位置<地表>



凡例	【測定点凡例<今回の空間線量率:地上1m(μSv/h)>】			
	● 0.23以下	● 0.5より大きく0.75以下	● 1.0より大きく3.8以下	
	● 0.23より大きく0.5以下	● 0.75より大きく1.0以下	● 3.8より大きい	
	文字:測定番号		□:報告書の対象とする敷地範囲	


備考欄

測定ポイント			空間線量率100cm高							備考	除染時 測定 番号
測定 番号	対象物	測定点 種別*	測定値(μSv/h)*				低減率(% 対緊急除染前比)				
			緊急 除染前	緊急 除染後	前回 FU除染後	今回	緊急 除染後	前回 FU除染後	今回		
1	舗装面	◆	4.40	2.78	0.48	0.31	37	89	93	アスファルト・コンクリート	A08
2	舗装面	◆	4.10	2.04	0.36	0.26	50	91	94	アスファルト・コンクリート	A11
3	舗装面	◆	3.70	1.94	0.38	0.30	48	90	92	アスファルト・コンクリート	A13
4	舗装面	◆	3.40	2.02	0.44	0.31	41	87	91	アスファルト・コンクリート	B07
5	舗装面	◆	4.40	2.23	0.31	0.22	49	93	95	アスファルト・コンクリート	B10
6	舗装面	◆	6.40	2.97	0.36	0.26	54	94	96	アスファルト・コンクリート	B14
7	舗装面	◆	3.70	2.09	0.43	0.33	44	88	91	アスファルト・コンクリート	C04
8	未舗装面		4.22	2.95	0.81	0.63	30	81	85	土(林縁)	C15
9	舗装面	◆	3.40	1.68	0.46	0.27	51	86	92	アスファルト・コンクリート	D02
10	未舗装面	◆	4.50	2.04	0.22	0.13	55	95	97	草・芝	D09
11	舗装面	◆	4.10	2.38	0.22	0.11	42	95	97	アスファルト・コンクリート	D11
12	舗装面	◆	4.40	2.92	0.30	0.19	34	93	96	タイル・ブロック・レンガ	D13
13	未舗装面	◆	4.03	2.53	0.24	0.18	37	94	96	土	E04
14	舗装面	◆	2.25	1.32	0.34	0.21	41	85	91	アスファルト・コンクリート	E14
15	舗装面	◆	2.30	1.41	0.41	0.32	39	82	86	アスファルト・コンクリート	E16
16	舗装面	◆	4.70	2.41	0.18	0.13	49	96	97	アスファルト・コンクリート	F07
17	舗装面	◆	4.90	1.84	0.20	0.13	62	96	97	草・芝	F09
18	未舗装面	◆	4.80	2.51	0.35	0.28	48	93	94	土	F13
19	未舗装面	◆	4.40	2.78	0.42	0.26	37	90	94	土	G05
20	未舗装面	◆	4.30	3.05	0.33	0.26	29	92	94	土	G09
21	舗装面	◆	3.40	2.18	0.36	0.30	36	89	91	アスファルト・コンクリート	G14
22	舗装面	◆	2.50	1.65	0.41	0.30	34	84	88	アスファルト・コンクリート	G17
23	舗装面	◆	2.94	1.87	0.39	0.32	36	87	89	アスファルト・コンクリート	H08
24	舗装面	◆	3.40	2.06	0.45	0.33	39	87	90	アスファルト・コンクリート	H14
25	舗装面	◆	4.06	1.83	0.36	0.22	55	91	95	アスファルト・コンクリート	H17
26	舗装面	◆	3.26	2.04	0.54	0.34	37	83	90	アスファルト・コンクリート	I02
27	未舗装面	◆	4.88	3.25	0.29	0.23	33	94	95	その他	I06
28	未舗装面	◆	4.55	2.93	0.50	0.40	36	89	91	その他	I09
29	舗装面	◆	2.48	1.64	0.42	0.29	34	83	88	アスファルト・コンクリート	I11
30	舗装面	◆	2.71	1.71	0.39	0.30	37	86	89	アスファルト・コンクリート	I13
31	未舗装面	◆	4.51	3.06	0.39	0.30	32	91	93	土	I16
32	未舗装面	◆	4.90	3.66	0.47	0.26	25	90	95	土	I18
33	未舗装面	◆	5.15	3.50	0.66	0.43	32	87	92	その他	J03
34	舗装面	◆	2.98	1.95	0.34	0.27	35	89	91	アスファルト・コンクリート	J08
35	未舗装面	◆	4.60	3.33	0.29	0.23	28	94	95	土	J12
36	舗装面		4.18	3.37	0.71	0.52	19	83	88	アスファルト・コンクリート(林縁)	J19
37	未舗装面	◆	5.45	3.50	0.57	0.51	36	90	91	その他	K01
38	舗装面	◆	2.50	1.85	0.53	0.41	26	79	84	アスファルト・コンクリート	K04
39	舗装面	◆	2.38	1.88	0.35	0.27	21	85	89	アスファルト・コンクリート	K07
40	舗装面	◆	2.06	1.33	0.39	0.29	35	81	86	アスファルト・コンクリート	K10
41	未舗装面	◆	5.18	2.91	0.31	0.23	44	94	96	土	K15
42	舗装面	◆	3.50	2.01	0.54	0.33	43	85	91	アスファルト・コンクリート	K17
43	舗装面	◆	2.50	1.85	0.29	0.25	26	88	90	アスファルト・コンクリート	L05
44	未舗装面	◆	3.96	3.02	0.24	0.19	24	94	95	土	L08
45	未舗装面	◆	5.02	3.95	0.47	0.33	21	91	93	土	L13
46	未舗装面	◆	2.77	2.11	0.54	0.21	24	81	92	砂利	M03
47	舗装面	◆	2.97	1.84	0.35	0.28	38	88	91	アスファルト・コンクリート	M08
48	未舗装面	◆	4.95	3.90	0.52	0.43	21	89	91	土	M17
49	未舗装面	◆	5.35	3.88	0.95	0.29	27	82	95	砂利	N02

*測定点種別: ◆は庭等の屋外で、人が比較的多くの時間を過ごすことが想定される場所等(生活空間)における平均的な線量率を把握するための測定点を示す
*測定値(μSv/h): 対象物近傍を測定した空間線量率の値

行政区名	高瀬	管理番号	011001110
地権者名	浪江町 様		
所在地	大字高瀬字丈六10 外		
測定日 (天候)	緊急 除染前	平成24年6月20日, 平成24年6月21日(晴)	
	緊急 除染後	平成24年11月21日, 平成24年11月22日(晴)	
	前回 FU除染後	平成28年11月2日(晴)、平成28年11月14日(晴)	
	今回	平成29年9月29日(晴)、平成29年10月6日(晴)	

今回測定の高さの放射線量(μSv/h)測定位置<地表>

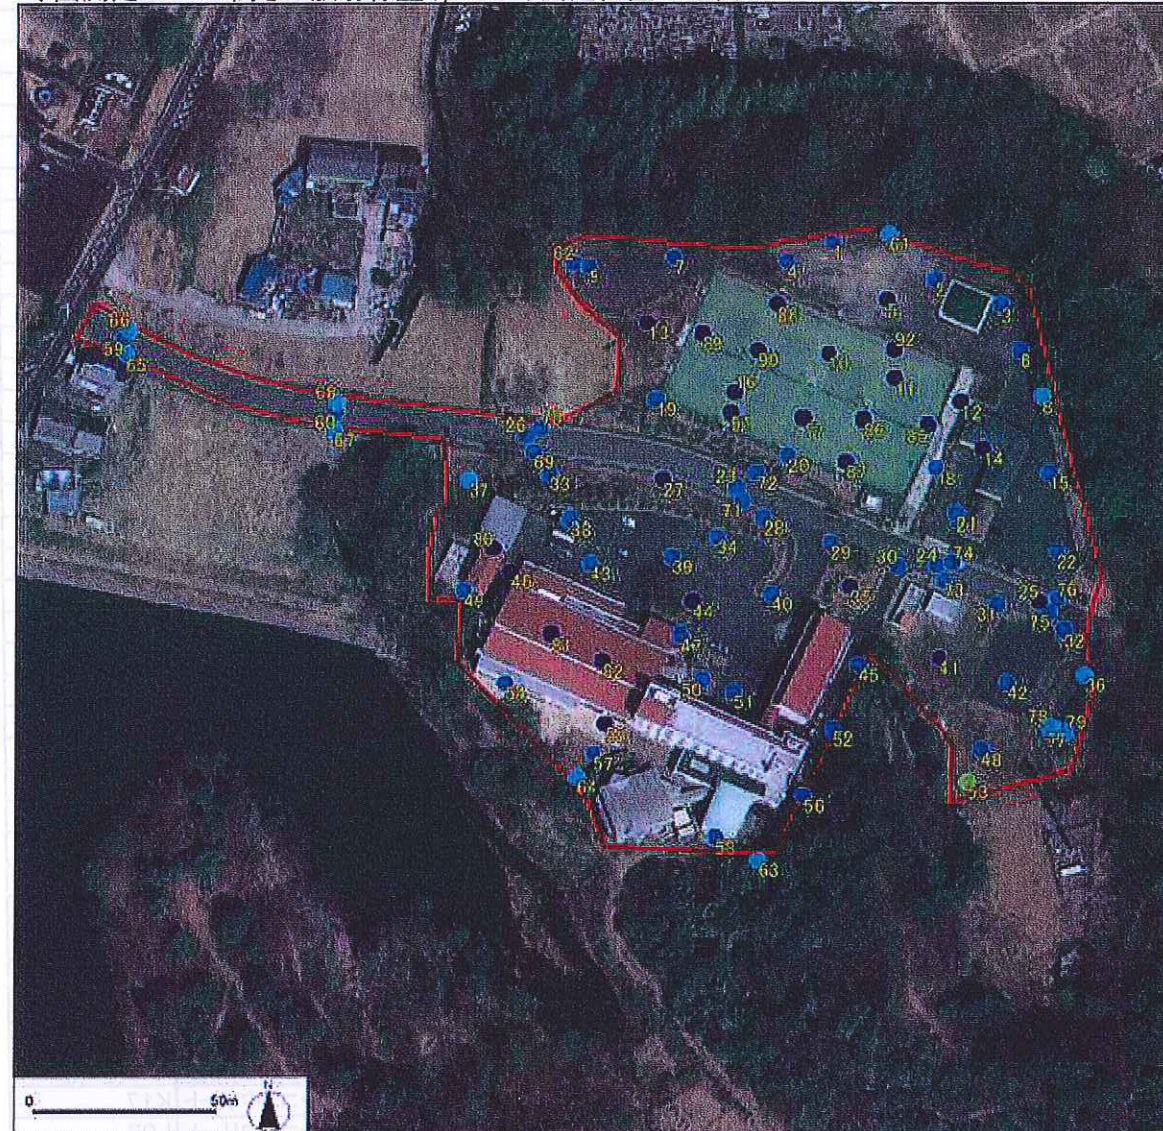

凡例	【測定点凡例<今回の空間線量率:地上1m(μSv/h)>】			
	● 0.23以下	● 0.5より大きく0.75以下	● 1.0より大きく3.8以下	
	● 0.23より大きく0.5以下	● 0.75より大きく1.0以下	● 3.8より大きい	
	文字:測定番号		:報告書の対象とする敷地範囲	

測定ポイント			空間線量率100cm高							備考	除染時 測定 番号
測定 番号	対象物	測定点 種別*	測定値(μSv/h)*				低減率(% 対緊急除染前比)				
			緊急 除染前	緊急 除染後	前回 FU除染後	今回	緊急 除染後	前回 FU除染後	今回		
50	未舗装面	◆	5.42	4.21	0.33	0.25	22	94	95	土	N09
51	舗装面	◆	2.22	1.60	0.37	0.31	28	83	86	アスファルト・コンクリート	N10
52	舗装面	◆	2.30	1.66	0.48	0.37	28	79	84	アスファルト・コンクリート	N13
53	未舗装面		4.78	4.01	0.99	0.76	16	79	84	土(林縁)	N17
54	未舗装面	◆	1.62	0.77	0.35	0.26	52	78	84	砂利	P04
55	未舗装面	◆	6.18	3.32	0.27	0.21	46	96	97	砂利	P07
56	舗装面	◆	1.72	1.34	0.39	0.30	22	77	83	アスファルト・コンクリート	P13
57	未舗装面	◆	6.18	5.18	0.41	0.29	16	93	95	土	Q07
58	未舗装面	◆	4.22	3.35	0.52	0.41	21	88	90	砂利	R11
59	舗装面	◆	3.02	2.21	0.69	0.45	27	77	85	アスファルト・コンクリート	S02
60	舗装面	◆	2.57	1.84	0.61	0.42	28	76	84	アスファルト・コンクリート	S08
61	未舗装面		-	-	0.87	0.68	-	-	-	土(林縁)	
62	未舗装面		-	-	0.87	0.31	-	-	-	土(林縁)	
63	未舗装面		-	-	0.71	0.58	-	-	-	土(林縁)	
64	未舗装面		-	-	0.95	0.74	-	-	-	土(林縁)	
65	舗装面	◆	-	-	0.77	0.65	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
66	舗装面	◆	-	-	0.84	0.64	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
67	舗装面		-	-	0.76	0.56	-	-	-	アスファルト・コンクリート(林縁)	
68	舗装面	◆	-	-	0.80	0.58	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
69	舗装面	◆	-	-	0.52	0.38	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
70	舗装面	◆	-	-	0.78	0.39	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
71	舗装面	◆	-	-	0.40	0.33	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
72	舗装面	◆	-	-	0.58	0.44	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
73	舗装面	◆	-	-	0.42	0.33	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
74	舗装面	◆	-	-	0.40	0.27	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
75	舗装面	◆	-	-	0.47	0.30	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
76	舗装面	◆	-	-	0.47	0.28	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
77	舗装面	◆	-	-	0.76	0.54	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
78	舗装面	◆	-	-	0.80	0.60	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
79	舗装面		-	-	0.96	0.71	-	-	-	アスファルト・コンクリート(林縁)	
80	未舗装面	◆	-	-	-	0.23	-	-	-	砂利	
81	未舗装面	◆	-	-	-	0.19	-	-	-	砂利	
82	未舗装面	◆	-	-	-	0.20	-	-	-	砂利	
85	舗装面	◆	-	-	-	0.15	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
86	舗装面	◆	-	-	-	0.10	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
87	舗装面	◆	-	-	-	0.15	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
88	舗装面	◆	-	-	-	0.14	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
89	舗装面	◆	-	-	-	0.14	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
90	舗装面	◆	-	-	-	0.10	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
91	舗装面	◆	-	-	-	0.15	-	-	-	アスファルト・コンクリート	
92	舗装面	◆	-	-	-	0.17	-	-	-	アスファルト・コンクリート	

備考欄

*測定点種別: ◆は庭等の屋外で、人が比較的多くの時間を過ごすことが想定される場所等(生活空間)における平均的な線量率を把握するための測定点を示す
*測定値(μSv/h): 対象物近傍を測定した空間線量率の値

資料4-3②

*測定点種別: ◆は庭等の屋外で、人が比較的多くの時間を過ごすことが想定される場所等(生活空間)における平均的な線量率を把握するための測定点を示す
*測定値($\mu\text{Sv/h}$): 対象物近傍を測定した空間線量率の値

資料4-3③



平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.1

遊歩道

草刈状況




平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.2

遊歩道法面

表土の削り取り状況

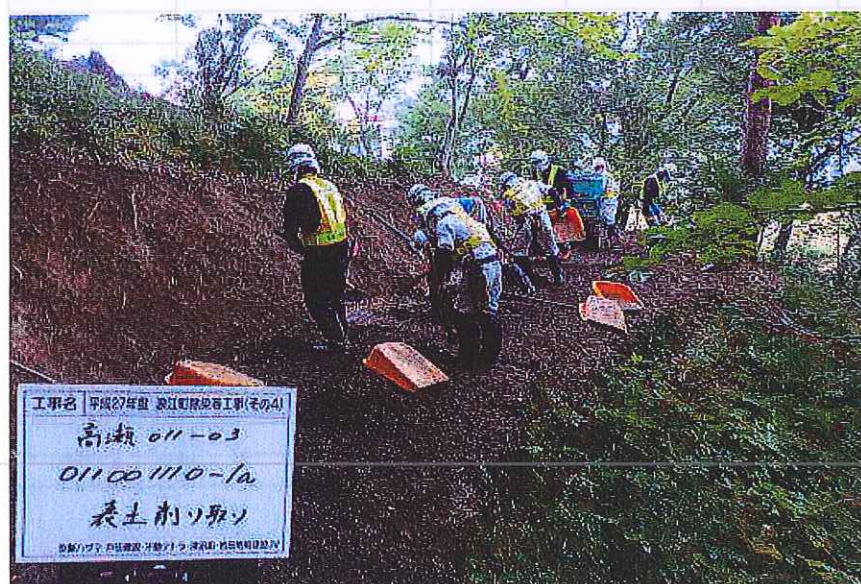

平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.3

遊歩道法面

表土の削り取り状況

資料4-3③



平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.4

遊歩道

削り取り土運搬状況



平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.5

遊歩道

地表面被覆状況



平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.6

遊歩道

地表面被覆状況

資料4-3③



平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.7

遊歩道

除染完了状況




平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.8

遊歩道

除染完了状況

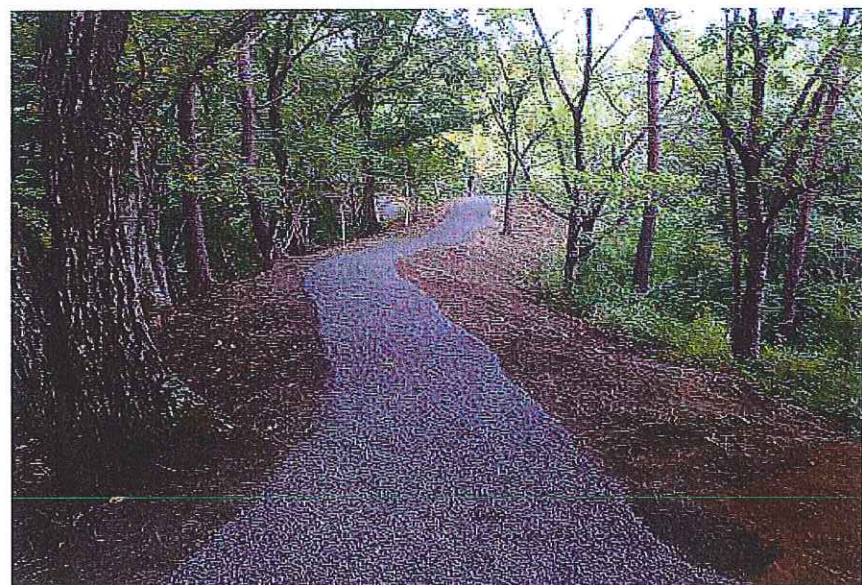

平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.9

遊歩道

除染完了状況

資料4-3③




平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.10

遊歩道

除染完了状況

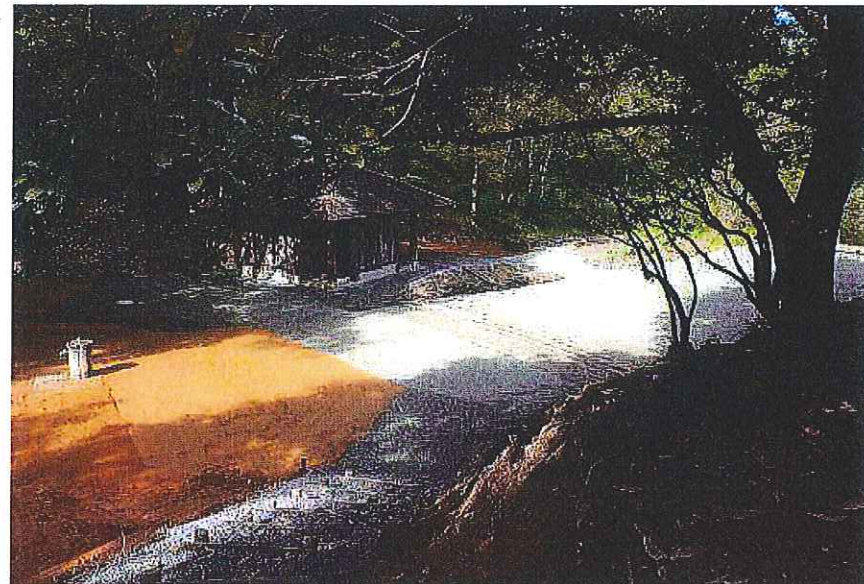

平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.11

遊歩道

除染完了状況



平成27年度浪江町除染等工事(その4)

いこいの村なみえFU除染工事

No.12

南側斜面

除染完了状況

